

倉吉市水道事業業務状況説明書

平成27年度下半期

自 平成27年10月 1 日

至 平成28年 3 月31日

倉吉市水道局

目 次

1	概 況	
(1)	総括事項	1
(2)	議会議決事項	1
(3)	行政官庁認可事項	1
(4)	職員に関する事項	2
(5)	料金その他供給条件の設定及び変更に関する事項	2
2	工 事	
(1)	改良工事の概況	3
(2)	保存工事の概況	4
3	業 務	
(1)	業務量	5～6
(2)	事業収入に関する事項	7
(3)	事業費に関する事項	7
4	会 計	
(1)	重要契約の要旨	8
(2)	企業債及び一時借入金の概況	8
(3)	試算表	8
	キャッシュ・フロー計算書	9
	損益計算書	10
	貸借対照表	11～12
5	附帯事項	
(1)	給水工事の概況	13
(2)	受託工事の概況	13
(3)	修繕工事の概況	13
(4)	指定工事事業者	13～15
	別表 建設工事等の概況表	16～20

1 概況

(1) 総括事項

本年度下期は、建設改良工事として和田東町配水管布設工事等の配水工事を実施し、老朽管布設替え等の漏水防止対策を行うと共に、市道八屋福庭線道路改良工事に伴う配水管布設を行った。これらの工事により、良質で安全な水道水を確保し、もって住民サービスの向上を図り、水道事業の健全経営に努めた。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第77号	平成27年度倉吉市水道事業会計補正予算（第1号）	平成27年10月16日	平成27年10月16日
議案第78号	損害賠償の額の決定について	平成27年10月16日	平成27年10月16日
議案第85号	平成27年度倉吉市水道事業会計補正予算（第2号）	平成27年11月30日	平成27年12月16日
議案第5号	平成27年度倉吉市水道事業会計補正予算（第3号）	平成28年2月22日	平成28年2月22日
議案第32号	平成28年度倉吉市水道事業会計予算	平成28年2月29日	平成28年3月24日
議案第40号	倉吉市職員の給与に関する条例等の一部改正について（倉吉市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）	平成28年2月29日	平成28年3月24日

(3) 行政官庁許認可事項


今期該当事項無し

(4) 職員に関する事項

ア 人事異動について

今期該当事項無し

イ 水道局の職員構成は、次のとおりである。

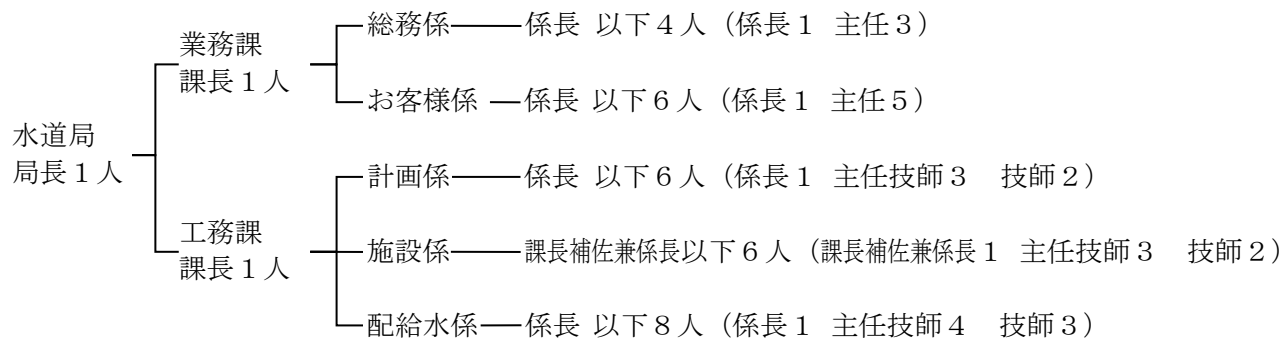

ウ 平均給与

職種\種別	人員	本俸	諸手当	合計	平均勤務年数	平均年齢	備考
一般	月額 33人	10,260,960円	6,157,127円	16,418,087円	17年 1月	42歳 1月	
職員	一人平均	310,938円	186,580円	497,518円			

(5) 料金その他供給条件の設定及び変更に関する事項

今期該当事項なし

2 工 事

(1) 改良工事の概況

ア 配水工事

別表「建設工事等の概況表」のとおり

イ 施設改良工事

工事

工事名	工事内容	契約の相手	工事費(税込)	契約年月日	工 期	工事完成日 完成検査日
黒見配水池配電盤 格納庫新築工事	構造 鉄骨造平屋 建築面積 7.45㎡	㈲竹田工業	2,185,920円	H27.11.24	H27.11.25 H28.2.29	H28.2.26 H28.3.4
みどり町ポンプ室 ポンプ設置工事	ポンプ据付工 1式 ポンプ制御盤他 取替工 1式 排水構造物工 26.0m 階段設置工 1式	㈲長谷川商 店	8,817,120円	H27.11.25	H27.11.26 H28.3.11	H28.3.11 H28.3.17
合計			11,003,040円			

業務

業務名	業務内容	契約の相手	委託料(税込)	契約年月日	履行期間	業務完了日 完了検査日
倉吉市上水道中央 集中監視制御装置 設計業務	中央監視操作施 設計画 1式 計装設備計画 (新規) 1ヶ所 (既設) 26ヶ所	㈱日本都市 工学設計鳥 取営業所	3,240,000円	H27.7.9	H27.7.10 H28.3.18	H28.3.18 H28.3.24

ウ その他営業設備事業

事業名	事業内容	金額(税込)	備考
機械及び装置購入費	<ul style="list-style-type: none"> ・量水器 1,017個 ・黒見配水池緊急遮断弁制御装置 1式 ・米田町配水池緊急遮断弁制御装置 1式 ・円谷町水源地次亜貯留槽 1槽 ・黒見第2水源地次亜貯留槽 1槽 ・余戸谷町水源地滅菌器 1台 ・黒見第2水源地滅菌器 1台 ・円谷町水源地滅菌器 1台 ・みどり町ポンプ室電磁流量計 1台 ・生竹配水塔電磁流量計 1台 	3,318,278円 3,210,300円 2,732,400円 380,160円 162,000円 3,942,000円 2,808,000円 3,996,000円 302,400円 432,000円	
車両運搬具購入費	・軽貨物自動車購入 1台(10号車)	1,169,000円	
計		22,452,538円	

(2) 保存工事の概況

ア 配・給水管の状況

別表「建設工事等の概況表」のとおり

イ 施設整備の状況

工事

工事名	工事内容	契約の相手	工事費(税込)	契約年月日	工期	工事完成日 完成検査日
上井配水池階段補修工事	縦格子補修 6本 支柱控え梁 1箇所 塗装 94.8㎡ 外部足場 217.2㎡	㈱吉田塗装店	1,628,640円	H27. 8. 10	H27. 8. 11 H27. 12. 11	H27. 10. 30 H27. 11. 5

業務

業務名	業務内容	契約の相手	委託料(税込)	契約年月日	履行期間	業務完了日 完了検査日
倉吉市上水道施設耐震簡易診断・台帳作成業務	耐震簡易診断 11施設 施設調書作成 30施設 施設更新計画 1業務	㈱ウエスコ 倉吉営業所	7,668,000円	H27. 6. 5	H27. 6. 8 H28. 3. 18	H28. 3. 18 H28. 3. 24

ウ 公道部分修繕の状況

(単位：件)

月別	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	備考
件数	36	21	25	28	29	32	171	

エ 量水器の取替状況

(単位：件)

月別\口径別	13mm	20mm	25mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	計	備考
10月	45	103	31	5	3	2			189	
11月		44							44	11月で完了
12月									0	
1月									0	
2月									0	
3月									0	
計	45	147	31	5	3	2	0	0	233	

3 業 務

(1) 業務量

ア 給水戸数

(単位：戸)

区分\期別	平成27年度下半期	前年同期	増 減
戸 数	18,201	18,194	7

イ 総配水量

(単位：m³)

月別\区分	月間総配水量	1日最大配水量	1日最小配水量	1日平均配水量	備 考
10月	481,096	16,033	14,235	15,519	
11月	455,279	15,831	14,438	15,176	
12月	476,380	16,358	14,567	15,367	
1月	507,465	27,227	13,662	16,370	
2月	476,165	17,524	15,115	16,419	
3月	480,953	16,389	14,627	15,515	
計	2,877,338	—	—	—	
平均	479,556	—	—	15,723	

ウ 水源地別配水量

(単位：m³)

水源地別\月別	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	備 考
余戸谷町水源地	129,853	122,641	126,995	132,978	105,066	90,582	708,115	
東巖城町水源地	156,447	151,238	156,628	156,559	145,977	155,516	922,365	
円谷町水源地	100,727	95,823	101,362	109,397	111,697	129,333	648,339	
八屋水源地	28,526	23,116	26,187	37,222	38,659	29,139	182,849	
大原第1水源地	5,870	5,731	6,253	6,592	6,012	6,368	36,826	
黒見第1水源地	16,114	14,962	15,974	20,688	27,790	28,888	124,416	
黒見第2水源地	26,325	24,768	25,699	26,996	25,204	23,362	152,354	
生竹水源地	17,234	17,000	17,282	17,033	15,760	17,765	102,074	
計	481,096	455,279	476,380	507,465	476,165	480,953	2,877,338	

エ 有収水量

(単位：m³)

月別\用途別	用 途 区 分								計	備 考
	家事営業	官公署	学 校	病 院	工場会社	団 体	湯屋	その他		
10月	323,162	7,346	17,921	24,965	39,317	13,293	0	387	426,391	
11月	323,339	7,324	17,114	24,482	39,309	13,150	0	385	425,103	
12月	314,089	6,429	14,728	21,823	33,864	11,212	0	378	402,523	
1月	313,914	6,235	15,619	25,556	38,448	12,470	0	491	412,733	
2月	330,476	7,886	18,617	28,878	41,080	14,052	0	400	441,389	
3月	323,241	6,663	15,989	22,729	36,327	11,676	0	331	416,956	
計	1,928,221	41,883	99,988	148,433	228,345	75,853	0	2,372	2,525,095	

オ 有収率

区分\期別	平成27年度下半期	前年同期	比 較	備 考
有収水量	2,525,095m ³	2,498,909m ³	26,186m ³	
総配水量	2,877,338m ³	2,895,238m ³	△17,900m ³	
有 収 率	87.8%	86.3%	1.5pt	

カ 電動機運転時間

(単位：時間)

水源地別\月別	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	備考
余戸谷町水源	415	399	417	442	354	312	2,339	
東巖城町水源	744	718	744	748	696	744	4,394	
円谷町水源	342	324	345	372	381	445	2,209	
八屋水源	139	113	127	180	188	142	889	
大原第1水源	283	269	280	293	258	280	1,663	
大原第1取水	44	46	27	105	42	44	308	
大原第2取水	35	31	50	28	93	34	271	
大原第3取水	60	36	50	50	53	64	313	
黒見第1水源	122	113	121	155	208	216	935	
黒見第1取水	218	196	208	271	356	393	1,642	
黒見第2取水	148	142	154	196	269	257	1,166	
黒見第2水源	432	413	436	459	430	403	2,573	
生竹水源	556	538	561	584	531	570	3,340	
計	3,538	3,338	3,520	3,883	3,859	3,904	22,042	

キ 使用電力量

(単位：kWh)

水源地別\月別	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	備考
余戸谷町水源	44,883	43,159	45,198	47,976	38,650	34,422	254,288	
東巖城町水源	43,296	41,997	43,418	43,255	40,747	43,624	256,337	
円谷町水源	26,170	24,710	26,075	28,133	28,688	33,313	167,089	
八屋水源	7,879	6,526	7,365	10,117	10,399	8,217	50,503	
大原第1水源	3,543	3,375	3,526	3,699	3,274	3,529	20,946	
大原第1取水	769	792	478	1,666	728	767	5,200	
大原第2取水	581	524	817	469	1,469	567	4,427	
大原第3取水	989	609	829	825	861	1,028	5,141	
黒見第1水源	3,047	2,819	3,011	3,833	5,090	5,296	23,096	
黒見第1取水	1,884	1,700	1,804	2,342	3,082	3,396	14,208	
黒見第2取水	743	713	777	983	1,353	1,280	5,849	
黒見第2水源	12,216	11,702	12,351	12,916	12,099	11,347	72,631	
生竹水源	11,142	10,754	11,290	11,697	10,690	11,494	67,067	
計	157,142	149,380	156,939	167,911	157,130	158,280	946,782	

ク 滅菌機次亜液使用状況

(単位：ℓ)

水源地別\月別	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	備考
余戸谷町水源	420	380	1,260	0	0	1,000	3,060	
東巖城町水源	0	1,000	0	1,000	0	0	2,000	
円谷町水源	300	300	260	220	1,000	0	2,080	
八屋水源	80	100	100	120	120	100	620	
大原第1水源	40	20	60	20	20	20	180	
黒見第1水源	20	40	20	60	60	80	280	
黒見第2水源	40	40	40	20	140	20	300	
生竹水源	40	60	60	60	40	60	320	
計	940	1,940	1,800	1,500	1,380	1,280	8,840	

(2) 事業収入に関する事項

事業収入の概況（税込）（平成27年10月～平成28年3月）

（単位：円）

科目\区分		予算額(A)	収入額	構成比率 (100分比)	Aに対する 比率	備考
営業 収益	水道料金	687,631,000	349,257,373	78.9%	50.8%	
	量水器使用料	26,358,000	13,192,823	3.0%	50.1%	
	受託工事収益	663,000	560,590	0.1%	84.6%	
	その他営業収益	92,858,000	45,767,738	10.3%	49.3%	
	小計	807,510,000	408,778,524	92.3%	50.6%	
営業外 収益	長期前受金戻入	43,306,000	21,936,187	5.0%	50.7%	
	その他	16,417,000	11,697,664	2.6%	71.3%	
	小計	59,723,000	33,633,851	7.6%	56.3%	
特別利益		276,000	315,061	0.1%	114.2%	
合計		867,509,000	442,727,436	100.0%	51.0%	

(3) 事業費に関する事項

事業費の概況（税込）（平成27年10月～平成28年3月）

（単位：円）

科目\区分		予算額(A)	執行額	構成比率 (100分比)	Aに対する 比率	備考
営業 費用	人件費	217,620,000	128,257,015	28.3%	58.9%	予備費から 566,000
	動力費	37,886,000	17,340,857	3.8%	45.8%	
	減価償却費	264,935,000	132,500,466	29.2%	50.0%	
	物件費・その他	171,651,000	116,854,593	25.7%	68.1%	
	小計	692,092,000	394,952,931	87.0%	57.1%	
営業外 費用	支払利息	54,430,000	26,600,867	5.8%	48.9%	
	消費税等	33,006,000	31,153,300	6.9%	94.4%	
	その他	5,000	0	0.0%	0.0%	
	小計	87,441,000	57,754,167	12.7%	66.0%	
特別損失		1,738,000	1,169,829	0.3%	67.3%	
予備費		1,434,000	0	0.0%	0.0%	営業費用・人件費へ 566,000
合計		782,705,000	453,876,927	100.0%	58.0%	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

今期該当事項なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債の状況

(単位：円)

借入先	平成27年9月30日 現在高	下半期中借入額	下半期中償還額	平成28年3月31日 現在高	備考
財務省財政融資資金	1,288,945,451	0	40,810,477	1,248,134,974	
地方公共団体金融機構	868,143,609	101,700,000	29,685,724	940,157,885	
山陰合同銀行	210,415,000	0	27,365,000	183,050,000	
計	2,367,504,060	101,700,000	97,861,201	2,371,342,859	

イ 一時借入金の状況

今期該当事項なし

(3) 試算表（平成28年3月31日現在）

(単位：円)

勘定科目	借方	貸方	勘定科目	借方	貸方
固定資産	5,327,013,374		固定負債		2,302,905,648
有形固定資産	5,316,076,369		企業債		2,179,560,877
無形固定資産	10,937,005		退職給付引当金		123,344,771
流動資産	993,214,060		流動負債		309,224,562
現金・預金	954,483,209		企業債		191,781,982
未収金	28,985,513		未払金		10,988,400
貯蔵品	9,745,338		賞与引当金		15,060,414
前払金	0		法定福利費引当金		2,900,353
その他流動資産	0		預り金		88,493,413
資本金		2,200,800,082	その他流動負債		0
剰余金		718,811,658	繰延収益		686,579,777
資本剰余金		5,782,341	長期前受金		686,579,777
利益剰余金		713,029,317	水道事業収益		821,070,314
資本的収入整理勘定		0	営業収益		761,345,202
固定資産売却代金		0	営業外収益		59,283,931
資本的支出整理勘定	0		特別利益		441,181
建設改良費	0		水道事業費用	719,164,607	
			営業費用	662,883,226	
			営業外費用	54,644,466	
			特別損失	1,636,915	
			合計	7,039,392,041	7,039,392,041

平成27年度 倉吉市水道事業キャッシュ・フロー計算書
(平成27年10月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 当年度下半期純利益		△ 1,990,362	
(2) 当年度分損益勘定留保資金			
イ 減価償却費	132,500,466		
ロ 固定資産除却損	16,121,536		
ニ 長期前受金戻入額(△)	△ 21,936,187		
当年度分損益勘定留保資金 計			126,685,815
(3) 引当金の増加・減少(△は減少)			
イ 退職給付引当金の増減額	3,208,572		
ロ 賞与引当金の増減額	15,060,414		
ハ 法定福利費引当金の増減額	2,900,353		
ニ 貸倒引当金の増減額	△ 45,485		
引当金の増加・減少 計			21,123,854
(4) 資産及び負債の増減(業務活動に伴うもの)			
イ 未収金の増減額(△は増加)	7,785,720		
ロ 未払金の増減額(△は減少)	8,488,886		
ハ たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 28,260		
ニ 前払金の増減額(△は増加)	18,666,100		
ホ その他流動資産の増減額(△は増加)	6,756,783		
ヘ 預り金の増減額(△は減少)	△ 3,781,369		
ト その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 30,746,489		
資産及び負債の増減 計			7,141,371
(5) その他業務活動以外のもの			
イ 固定資産売却益(△)	△ 115,983		
イ 受取利息及び受取配当金(△)	△ 334,529		
ロ 支払利息	26,600,867		
その他業務活動以外のもの 計			26,150,355
業務活動によるキャッシュ・フロー 小計			179,111,033
(6) 投資活動、財務活動以外のもの			
イ 利息及び配当金の受取額	334,529		
ロ 利息の支払額(△)	△ 26,600,867		
その他業務活動以外のもの 計			△ 26,266,338
業務活動によるキャッシュ・フロー 計			152,844,695
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 有形固定資産の取得による支出(△)		△ 193,432,662	
(2) 有形固定資産の売却による収入		174,362	
(3) 工事負担金による収入		16,090,361	
(4) 他会計補助金による収入		5,354,998	
投資活動によるキャッシュ・フロー 計			△ 171,812,941
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		101,700,000	
(2) 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出(△)		△ 97,861,201	
財務活動によるキャッシュ・フロー 計			3,838,799
4 資金増減額(△は減少)			△ 15,129,447
5 資金期首残高			969,612,656
6 資金期末残高			954,483,209

平成27年度 倉吉市水道事業損益計算書
(平成27年10月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	335,701,789		
	(2) 受託工事収益	519,070		
	(3) その他営業収益	<u>42,422,233</u>	378,643,092	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	52,332,443		
	(2) 配水及び給水費	91,969,287		
	(3) 受託工事費	4,326,575		
	(4) 業務費	40,033,116		
	(5) 総係費	49,038,007		
	(6) 減価償却費	132,500,466		
	(7) 資産減耗費	16,129,715		
	(8) その他営業費用	<u>239,320</u>	<u>386,568,929</u>	
	営業利益			△ 7,925,837
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	334,529		
	(2) 他会計補助金	3,487,907		
	(3) 長期前受金戻入	21,936,187		
	(4) 雑収益	<u>7,906,246</u>	33,664,869	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	26,600,867		
	(2) 雑支出	<u>264,481</u>	<u>26,865,348</u>	<u>6,799,521</u>
	経常利益			△ 1,126,316
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	115,983		
	(2) 過年度損益修正益	<u>189,800</u>	305,783	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	199,829		
	(2) その他特別損失	<u>970,000</u>	<u>1,169,829</u>	<u>△ 864,046</u>
	当年度下期純利益			△ 1,990,362
	当年度上期純利益			103,896,069
	前年度繰越利益剰余金			324,490,758
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>62,508,315</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>488,904,780</u></u>

平成27年度 倉吉市水道事業貸借対照表
(平成28年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		192,269,987	
ロ 建物	275,603,828		
減価償却累計額	<u>△ 147,933,257</u>	127,670,571	
ハ 構築物	9,784,067,834		
減価償却累計額	<u>△ 5,074,006,590</u>	4,710,061,244	
ニ 機械及び装置	1,595,683,994		
減価償却累計額	<u>△ 1,323,948,977</u>	271,735,017	
ホ 車両運搬具	18,814,025		
減価償却累計額	<u>△ 14,598,904</u>	4,215,121	
ヘ 工具、器具及び備品	24,942,843		
減価償却累計額	<u>△ 17,818,414</u>	7,124,429	
ト 建設仮勘定		<u>3,000,000</u>	
有形固定資産合計			5,316,076,369
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		4,713,205	
ロ 電話加入権		221,800	
ハ その他無形固定資産		<u>6,002,000</u>	
無形固定資産合計			<u>10,937,005</u>
固定資産合計			5,327,013,374
2 流動資産			
(1) 現金・預金			954,483,209
(2) 未収金		29,445,730	
貸倒引当金		<u>△ 460,217</u>	28,985,513
(3) 貯蔵品			<u>9,745,338</u>
流動資産合計			<u>993,214,060</u>
資産合計			<u>6,320,227,434</u>

(単位：円)

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>2,179,560,877</u>		
企業債合計		2,179,560,877	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>123,344,771</u>		
引当金合計		<u>123,344,771</u>	
固定負債合計			2,302,905,648
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>191,781,982</u>		
企業債合計		191,781,982	
(2) 未払金		10,988,400	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	15,060,414		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,900,353</u>		
引当金合計		17,960,767	
(4) 預り金		<u>88,493,413</u>	
流動負債合計			309,224,562
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	367,000		
収益化累計額	<u>△ 348,650</u>	18,350	
ロ 他会計補助金	320,288,993		
収益化累計額	<u>△ 275,472,494</u>	44,816,499	
ハ 受贈財産評価額	287,791,280		
収益化累計額	<u>△ 176,958,405</u>	110,832,875	
ニ 工事負担金	1,240,392,788		
収益化累計額	<u>△ 709,480,735</u>	530,912,053	
長期前受金合計		<u>686,579,777</u>	
繰延収益合計			<u>686,579,777</u>
負債合計			<u><u>3,298,709,987</u></u>

資本の部

6 資本金			2,200,800,082
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	710,779		
ロ 受贈財産評価額	<u>5,071,562</u>		
資本剰余金合計		5,782,341	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	60,000,000		
ロ 利益積立金	4,000,000		
ハ 建設改良積立金	262,030,244		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>488,904,780</u>		
利益剰余金合計		<u>814,935,024</u>	
剰余金合計			<u>820,717,365</u>
資本合計			<u><u>3,021,517,447</u></u>
負債資本合計			<u><u>6,320,227,434</u></u>

5 附帯事項

(1) 給水工事の概況

(単位：件)

月別\種別	新設	増設	改造	撤去	計	備考
10月	30	0	15	1	46	
11月	18	0	11	1	30	
12月	12	0	9	0	21	
1月	3	0	6	1	10	
2月	12	0	10	1	23	
3月	23	0	2	0	25	
計	98	0	53	4	155	

(2) 受託工事の概況

ア 配・給水管布設工事

別表「建設工事等の概況表」のとおり

(3) 修繕工事の概況（屋内部分）

月別	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	備考
件数	0	1	0	0	1	1	3	

(4) 指定工事事業者

指定番号	業者名	住 所
1	(有)長谷川商店	倉吉市清谷町2丁目80
5	中海工業(株)	倉吉市福庭町1丁目55
8	(株)中電工 倉吉営業所	倉吉市八屋145-2
13	(株)トンボプロパンガス	倉吉市和田東町196-1
20	早田設備(株)	倉吉市和田東町115-1
22	(有)伯耆浄水	倉吉市古川沢163
23	倉吉管機工業(株)	倉吉市福庭町1丁目573
24	(株)ベクト総業	倉吉市井手畑158
25	(株)空研	倉吉市広栄町931-2
28	(有)高橋設備工業所	倉吉市八屋209-2
32	(有)中原設備商会	東伯郡北栄町西園98-1
33	米原総業	東伯郡湯梨浜町はわい温泉31-2
34	(有)いるか設備	東伯郡湯梨浜町久留20-11
35	(有)信方水道設備	東伯郡琴浦町大字赤碕1708-9
37	川口設備工業(有)	東伯郡湯梨浜町田後450-3
39	(有)天神設備	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬1622-1
41	(有)新宮設備	倉吉市中江227-6
42	日総工業(株)倉吉支店	倉吉市中江306-10
43	オグラ管機(有)	東伯郡三朝町大柿657
44	(株)ヘイセイ	東伯郡琴浦町徳万731
46	豊岡設備	東伯郡北栄町江北53-2
47	(株)伊藤建設	東伯郡琴浦町逢東873
49	スミ管機設備	倉吉市住吉町1-3
50	(有)キコー設備	東伯郡北栄町亀谷950-4
51	森田設備	倉吉市巖城1150-18
52	馬野建設(株)	東伯郡琴浦町大字赤碕1840-1
53	(株)井木組	東伯郡琴浦町大字赤碕2000-1

54	(有)ユア-設備計画	倉吉市和田 505-3
55	アイワ設備工業(有)	東伯郡北栄町亀谷 952-15
56	(有)あきやま総業	倉吉市富海 877
58	(有)山口設備	東伯郡三朝町森 618-9
60	(有)足立水道設備	東伯郡琴浦町大字赤碕 1942-3
61	(有)中本建設	東伯郡湯梨浜町宇野 1994-1
62	(株)ヨシムラ	東伯郡北栄町由良宿 551-2
64	(有)西本商会	東伯郡琴浦町浦安 444-2
65	(有)倉光建材店	東伯郡琴浦町浦安 233-16
68	(有)シュペール	鳥取市千代水 3 丁目 59
70	勇輝建設(有)	東伯郡湯梨浜町宇谷 735
71	(株)クラエ-	倉吉市宮川町 2 丁目 48-1
72	(株)吉村興産	倉吉市和田 271 番地 1
73	(有)アイティ設備	東伯郡琴浦町逢東 1213-3
74	すいどうや くらもと	東伯郡湯梨浜町宇野 1962-21
75	(有)ソケット	倉吉市旭田町 32
76	(有)第一設備工業	鳥取市商栄町 122-1
78	東伯建設(株)	倉吉市三江 168
80	(有)花井設備	米子市富益町 677
81	大和設備倉吉(株)	倉吉市和田東町 190
82	加登脇建設(株)	東伯郡琴浦町徳万 362
83	日ノ丸産業(株)倉吉支店	倉吉市海田東町 401
84	一工業(有)	米子市新開 1 丁目 1400-22
85	(株)みたこ土建	米子市八幡 486 番地 1
87	社工業	倉吉市西福守町 717
88	(有)美咲	倉吉市西福守町 601- 2
89	(株)高野組	東伯郡琴浦町大字赤碕 817 番地 7
90	(有)前嶋組	東伯郡湯梨浜町大字久見 178-2
91	天野水道	倉吉市関金町大鳥居 91-11
92	ナガタ設備	東伯郡琴浦町下伊勢 216-1
93	野崎設備工業	東伯郡湯梨浜町龍島 517
96	(有)昇和設備	東伯郡湯梨浜町上浅津 135-6
98	(有)パイプフレンド	鳥取市湖山町北三丁目 468
100	(株)トラスト	倉吉市八幡町 3304 番地の 5
101	Japan 環境設備(株)	鳥取市東大路 280-1
102	河野設備	倉吉市大立 57
103	滝本設備	東伯郡湯梨浜町藤津 414-1
104	(有)大友設備工業	米子市皆生新田 3 丁目 24-36
105	水谷工業(有)	倉吉市米田町 2 丁目 23-2
106	吉野設備工業(株)	鳥取市岩吉 96-28
107	(株)ながお	鳥取市鹿野町鹿野 2338 番地 12
108	アキ設備	倉吉市上神 1054-2
109	(株)サントウ	倉吉市円谷町 38 番地 1
111	(有)大伸設備工業	鳥取市興南町 148 番地
112	はごろも環境	倉吉市宮川町 169-1
113	(有)河本建設	倉吉市秋喜 485 番地 1
114	ベクトサービス(有)	倉吉市河北町 57 番地
115	(株)白兔設備水道	鳥取市湖山町東 3 丁目 72

117	西日本環境設備(株)	鳥取市千代水1丁目119番地
118	山陰冷暖設備(株)	鳥取市津ノ井302番地8
120	(有)池原工業	鳥取市気高町勝美184-2
121	(株)オグラ	鳥取市湖山町東3-51-2
122	住マイル設備	東伯郡北栄町西園504-1
123	山口水道設備	東伯郡北栄町西園845-5
124	(株)岩見組	東伯郡琴浦町大字逢東20番地
125	ヨネダ設備商会	倉吉市昭和町1-243
126	(有)西本機器水道	東伯郡琴浦町大字三保99番地8
127	ヤマグチショウカイ	倉吉市福光704-5
128	早島設備(有)	鳥取市福部町湯山959番地3
129	明生管工(有)	鳥取市賀露町4017
130	かすい電器設備	倉吉市小鴨534-7
131	(有)ダイワ鋼商	西伯郡日吉津村大字日吉津194番地9
132	(有)野藤商店	鳥取市青谷町善田42-2
134	(株)オオヒロ	鳥取市松並町1丁目168番地24
135	(同)ニシモト	東伯郡琴浦町大字浦安444番地9
136	(有)戸羽建設	東伯郡湯梨浜町大字園2202番地17
137	林設備	鳥取市江津971番地5
139	タカハシ管工(株)	倉吉市西倉吉町477番地4
140	(株)すばる住設	東伯郡三朝町大字西小鹿1148番地
141	(株)ウォーターワークス	倉吉市大河内369番地2
142	(株)アールコーポレーション	倉吉市見日町364番地1
143	(有)ヤマタホーム	鳥取市千代水2丁目130番地
144	三菱電機システムサービス(株)	鳥取市千代水2丁目61-1
145	(株)蒼進	鳥取市青谷町北河原225-3
146	(株)N. I. C	広島市中区舟入幸町21-23-1F

別表 建設工事等の概況表

(1) 工事

工事名	管種等	契約の相手	工事費 (税込;円)				契約年月日	工期	工事完成日 完成検査日
			改良工事 ア配水工事 (うち消火栓分)	保存工事 ア配・給水管 工事	受託工事 ア配・給水管 布設工事	合計			
市道八屋福庭線配水管布設工事	DIP(GX)φ250 L= 138.7 m	株トンボプロパンガス	6,102,000			6,102,000	H27.05.28	H27.05.29 H28.03.24	H28.03.22 H28.03.28
福庭配水管布設工事	HIVP(RRリング)φ75 L= 21.8 m HIVP(RRリング)φ50 L= 186.0 m 仕切弁φ75 1基 仕切弁φ50 2基 給水管切替 13ヶ所	株ユア一設備計画	5,569,560	1,620,000		7,189,560	H27.06.22	H27.06.23 H27.09.30	H27.09.30 H27.10.08
生田配水管布設工事	DIP(GX)φ75 L= 268.4 m 仕切弁φ75 9基 給水管切替 5ヶ所	株空研	9,959,760	643,680		10,603,440	H27.06.18	H27.06.19 H27.09.30	H27.09.30 H27.10.08
福光配水管布設工事	DIP(GX)φ150 L= 175.0 m DIP(GX)φ100 L= 6.0 m 仕切弁φ150 3基 地下式単口消火栓 1基 給水管切替 8ヶ所	株クラエー	10,374,480 (537,840)	1,719,360		12,093,840	H27.07.28	H27.07.29 H27.11.16	H27.11.10 H27.11.18
和田東町配水管布設工事	DIP(GX)φ150 L= 161.8 m DIP(GX)φ100 L= 16.2 m DIP(GX)φ75 L= 6.4 m 仕切弁φ150 2基 仕切弁φ100 1基 仕切弁φ75 1基 不断水仕切弁φ150 1基 不断水仕切弁φ100 2基 地下式単口消火栓 2基 給水管切替 2ヶ所	株バクト総業	15,049,800 (1,095,120)	870,480		15,920,280	H27.07.28	H27.07.29 H27.11.30	H27.11.17 H27.11.26
みどり町配水管布設工事	DIP(GX)φ150 L= 170.3 m DIP(GX)φ75 L= 55.3 m 仕切弁φ150 6基 仕切弁φ75 3基 地下式単口消火栓 2基 給水管切替 11ヶ所	大和設備倉吉株	13,284,000 (1,058,400)	1,304,640		14,588,640	H27.07.28	H27.07.29 H27.10.30	H27.10.21 H27.10.28

工事名	管種等	契約の相手	工事費 (税込;円)				契約年月日	工期	工事完成日 完成検査日
			改良工事 ア配水工事 (うち消火栓分)	保存工事 ア配・給水管 工事	受託工事 ア配・給水管 布設工事	合計			
山根配水管移設工事	DIP(GX)φ75 L= 2.5 m HIVPφ75 L= 1.5 m 給水管移設 2ヶ所	(有)ユア一設備計 画	286,200	81,000		367,200	H27.08.11	H27.08.12 H27.11.04	H27.10.19 H27.10.27
河北町外配水管布設工事	DIP(GX)φ100 L= 53.3 m DIP(GX)φ75 L= 124.8 m VPφ75 L= 4.5 m 仕切弁φ75 2基 給水管切替 19ヶ所	㈱クラエー	7,286,760	2,221,560		9,508,320	H27.08.05	H27.08.06 H27.11.20	H27.11.20 H27.11.30
上井枝線4工区配水管仮 設復旧工事	HIVPφ75 L= 81.0 m 仮設管PE管φ50 L= 82.0 m 給水管切替 17ヶ所 地下式単口消火栓 1基	タカハシ管工㈱	1,396,440 (261,360)	1,730,160		3,126,600	H27.09.03	H27.09.04 H27.12.18	H27.12.07 H27.12.17
和田配水管布設工事	DIP(GX)φ100 L= 178.2 m DIP(GX)φ75 L= 12.8 m 仕切弁φ100 4基 仕切弁φ75 1基 地下式単口消火栓 1基 給水管切替 4ヶ所	中海工業㈱	11,457,720 (498,960)	1,890,000		13,347,720	H27.09.03	H27.09.04 H27.12.04	H27.11.25 H27.11.30
山根配水管移設工事 (その2)	HIVPφ75 L= 16.0 m	(有)ユア一設備計 画	432,000			432,000	H27.09.11	H27.09.14 H27.11.04	H27.10.21 H27.10.27
海田東町配水管布設工事	DIP(GX)φ75 L= 144.1 m HIVP(RRロング)φ50 L= 40.7 m 仕切弁φ75 3基 仕切弁φ50 1基 地下式単口消火栓 1基 給水管切替 26ヶ所	㈱空研	7,243,560 (479,520)	3,973,320		11,216,880	H27.10.22	H27.10.23 H28.02.15	H28.02.15 H28.02.23
西福守町配水管布設工事 第2工区	DIP(GX)φ100 L= 13.9 m DIP(GX)φ75 L= 170.2 m 仕切弁φ100 1基 仕切弁φ75 1基 地下式単口消火栓 2基 給水管切替 5ヶ所	㈱トンボプロパ ンガス	7,881,840 (984,960)	891,000		8,772,840	H27.10.22	H27.10.23 H28.01.09	H28.01.09 H28.01.22

工事名	管種等	契約の相手	工事費 (税込;円)				契約年月日	工期	工事完成日 完成検査日
			改良工事 ア配水工事 (うち消火栓分)	保存工事 ア配・給水管 工事	受託工事 ア配・給水管 布設工事	合計			
旭田町配水管布設工事	HIVP(RR ^{ツグ})φ50 L= 42.5 m HIVP(RR)φ40 L= 140.0 m PE管φ30 L= 33.0 m 仕切弁φ50 1基 ボールバルブφ40 6基 給水管切替 18ヶ所	㈱ソケット	5,187,240	2,381,400		7,568,640	H27.10.22	H27.10.23 H28.01.09	H28.01.06 H28.01.14
和田東町配水管布設工事 第2工区	DIP(GX)φ150 L= 172.7 m HIVP(RR ^{ツグ})φ75 L= 160.5 m 仕切弁φ75 1基 不断水仕切弁φ150 1基 給水管切替 11ヶ所	㈱クラエー	13,090,680	1,955,880		15,046,560	H27.10.28	H27.10.29 H28.02.26	H28.02.26 H28.03.08
東昭和町配水管布設工事	HIVP(RR ^{ツグ})φ50 L= 149.9 m SGP(VD)φ50 L= 4.5 m 仕切弁φ50 4基 給水管切替 24ヶ所	㈱ユア-設備計 画	4,374,000	3,049,920		7,423,920	H27.10.29	H27.10.30 H28.02.10	H28.01.15 H28.01.22
中河原配水管布設工事	HIVP(RR ^{ツグ})φ75 L= 37.5 m HIVP(RR ^{ツグ})φ50 L= 41.0 m 仕切弁φ75 1基 仕切弁φ50 1基 不断水仕切弁φ75 1基 地下式単口消火栓 1基 給水管切替 14ヶ所	㈱ユア-設備計 画	3,292,920	2,269,080		5,562,000	H27.10.29	H27.10.30 H28.01.29	H28.01.06 H28.01.14
平成27年度小鴨橋添架管 補修工事	補修塗替えSGPφ250A L= 184.0 m	㈱浦川塗装店		1,259,280		1,259,280	H27.11.04	H27.11.05 H28.03.15	H28.02.22 H28.02.24
明治町配水管布設工事	DIP(GX)φ100 L= 58.0 m DIP(GX)φ75 L= 2.2 m 仕切弁φ100 1基 仕切弁φ75 1基 給水管切替 11ヶ所	バクトサービス (有)	4,168,800	2,234,520		6,403,320	H27.11.16	H27.11.17 H28.02.29	H28.02.29 H28.03.10
小鴨配水管布設工事	HIVP(RR ^{ツグ})φ75 L= 104.2 m HIVP(RR ^{ツグ})φ50 L= 177.7 m DIP(GX)φ75 L= 24.1 m 仕切弁φ75 3基 仕切弁φ50 1基 地下式単口消火栓 3基 給水管切替 16ヶ所	大和設備倉吉㈱	9,815,040	2,196,720		12,011,760	H27.11.26	H27.11.27 H28.03.14	H28.02.26 H28.03.03

工 事 名	管 種 等	契約の相手	工 事 費 (税込;円)				契約年月日	工 期	工事完成日 完成検査日
			改良工事 ア 配水工事 (うち消火栓分)	保存工事 ア 配・給水管 工事	受託工事 ア 配・給水管 布設工事	合 計			
主要地方道鳥取鹿野倉吉 線消火栓設置工事	地下式単口消火栓 1基	中海工業(株)	1,033,560 (1,033,560)			1,033,560	H27.12.14	H27.12.15 H28.02.29	H28.02.29 H28.03.07
一般県道仙隠岡田線消火 栓撤去設置工事	地下式単口消火栓 1基 消火栓撤去 1基	(株)クラエー	873,720 (873,720)			873,720	H27.12.14	H27.12.15 H28.02.29	H28.02.29 H28.03.08
山根外配水管布設工事	DIP(GX)φ150 L= 13.8m DIP(GX)φ100 L= 106.4m 不断水仕切弁φ150 1基 仕切弁φ100 2基 地下式単口消火栓 1基 給水管切替 9ヶ所	(有)伯耆浄水	7,390,440 (482,760)	1,736,640		9,127,080	H27.12.18	H27.12.21 H28.02.29	H28.02.29 H28.03.09
上余戸配水管布設工事	DIP(GX)φ75 L= 24.5m HIVPφ75 L= 3.5m 仕切弁φ75 1基 給水管切替 1ヶ所	(有)高橋設備工業 所	1,269,000	171,720		1,440,720	H28.01.06	H28.01.07 H28.02.29	H28.02.29 H28.03.10
平成27年度上灘枝線工事 第5工区埋設管撤去工事	撤去工 石綿管φ75 L= 120.0m	(有)藤原工務店		183,600		183,600	H28.02.04	H28.02.05 H28.03.15	H28.03.15 H28.03.22
合 計	総延長 L= 3,172.4m 消火栓総数 17基		146,819,520 (9,472,680)	34,383,960	0	181,203,480			

(注) DIP(GX)…ダクタイル鋳鉄管(耐震継手) HIVP・HIVP(RR[®])…耐衝撃性硬質塩化ビニル管 PE管…ポリエチレン管 SGP(VD)…ライニング鋼管
φ…口径(mm) L…管延長(m)

(2) 業務

業 務 名	業務内容	契約の相手	委 託 料 (税込;円)				契約年月日	履行期間	業務完了日 完了検査日
			改良工事 ア 配水工事 (うち消火栓分)	保存工事 ア 配・給水管 工事	受託工事 ア 配・給水管 布設工事	合 計			
上余戸地区配水管測量設計業務	設計 配水管詳細設計 L= 0.23 km 測量 4級基準点測量 N= 12点 現地測量 A= 0.018 k m ² 路線測量 L= 0.23 k m 用地測量 A= 0.05 万m ²	アサヒコンサル タント(株)倉吉支 社	3,419,280			3,419,280	H27.06.10	H27.06.11 H28.02.26	H28.02.26 H28.03.01
