

○計画期間：平成27年7月～平成32年3月（4年9箇月）

I. 中心市街地全体に係る評価

1. 平成28年度終了時点（平成29年3月31日時点）の中心市街地の概況

本市は、平成27年6月以降、認定計画に基づき、「みんなでつくる活気と賑わいの場、暮らしよい元気な中心市街地」を基本テーマとして、①「安全・安心で快適に暮らせる生活中心のまちづくり」、②「生活文化の薫る歴史的な街並みを活かした観光・交流拠点のまちづくり」、③「都市型産業の育成やビジネス創出へとつながるまちづくり」の3つの基本方針をもとに各事業を実施してきた。

認定2年目に入り、「若者子育て世帯買物応援事業」や「住民運営のサロン事業」などの継続的な取り組みにより、「安全・安心で快適に暮らせる生活中心のまちづくり」に繋がってきている。

また、ワールド・トレイルズ・カンファレンスやインバウンド版名探偵コナンミステリーツアーなどの開催により、「生活文化の薫る歴史的な街並みを活かした観光・交流拠点のまちづくり」を推進するとともに、「女性向けコミュニティ施設兼食料品販売施設整備事業」ではマーケティング・ニーズ調査により賑わいを創出する施設整備に向けた準備が実施され、「円形校舎活用事業」ではインバウンドを含む商業施設整備に向けた取り組みを実施がなされることで、「生活文化の薫る歴史的な街並みを活かした観光・交流拠点のまちづくり」と「都市型産業の育成やビジネス創出へとつながるまちづくり」への下地が構成されてきている。

また、平成28年度当初には事業を推進する専門人材として、経験が豊富な事業推進コーディネーターを設置し、平成28年度10月より新たに新しい視点を持つタウンマネージャーと地域おこし協力隊を加えることで、協働により人材の育成とともに事業のブラッシュアップ等を行うことができ、「都市型産業の育成やビジネス創出へとつながるまちづくり」に繋げることができた。一方、平成27年度に調査を行った「倉吉駅前ファーマーズマーケット」「小川記念館」「アーティストとの交流によるまちづくり拠点」については引き続き事業計画をブラッシュアップしている状況であり、当初より実施時期の遅れが生じている。

平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震が、それぞれの事業に少なからず影響を与えていることから、まずは事業に係る施設の早期の復旧や事業の進捗の回復をはかることが課題となっている。

今後、目標達成に向けて事業の追加を行う等検討し、確実な目標達成に向けて取り組んでいく。

2. 平成28年度の取組等に対する中心市街地活性化協議会の意見

倉吉市中心市街地活性化協議会においては、倉吉市をはじめ経済団体、事業者で構成する事務連絡会議を定例で開催し、基本計画掲載事業の進捗状況等について情報共有を図ると共に、推進における課題やその対応方策について検討を行い、中心市街地活性化

の総合調整を図った。また、各事業の推進については、事業推進コーディネーターやタウンマネージャーを設置するとともに、専門家を招聘し、事業設計や調整、運営支援を行い、併せて新たな事業発掘を行い、協議へ参画するなどして、事業化に向けて事業主体のサポートを行った。

基本計画の状況については、活性化の目標として掲げている3指標について、目標達成に向けた計画事業に係る施設の早期復旧や事業の進捗の回復が必要であると考えている。震災が発生していなければ、計画事業が遂行され中心市街地の活性化に対して効果的に発揮されていたことが予想され、事業のいち早い実施が望まれる。

II. 目標毎のフォローアップ結果

1. 目標達成の見通し

目標	目標指標	基準値	目標値	最新値	前回の 見通し	今回の 見通し
誰もが持続的に住みたく暮らしやすい生活環境を備えたまち	中心市街地全体の人口の社会増減	△121人 (H21-26年の累計)	±0人 (H27-32年の累計)	△13人 (H27-H29年の累計)	③	③
歴史的・文化的資源を活かした回遊型観光のまち	中心市街地における観光入込客数	375,500人 (H25年)	421,400人 (H31年)	318,977人 (H28年)	①	③
小規模でも高付加価値な事業活動を創出するまち	中心市街地における創業事業所数	平均5件/年 (H21-25年度の平均)	平均8件/年 (H27-31年度の平均)	平均6件/年 (H27-29年度の平均)	③	③

<取組の進捗状況及び目標達成に関する見通しの分類>

- ①取組（事業等）の進捗状況が順調であり、目標達成可能であると見込まれる。
- ②取組の進捗状況は概ね予定どおりだが、このままでは目標達成可能とは見込まれず、今後対策を講じる必要がある。
- ③取組の進捗状況は予定どおりではないものの、目標達成可能と見込まれ、引き続き最大限努力していく。
- ④取組の進捗に支障が生じているなど、このままでは目標達成可能とは見込まれず、今後対策を講じる必要がある。

2. 目標達成見通しの理由

■基本計画目標指標の状況

【中心市街地全体の人口の社会増減】

平成21年から26年までの5年間に於いて中心市街地全体の人口の社会増減の累計は△121人であったが、平成27年2月から平成29年1月までの2年間に於いては△13人となった。

住宅リフォーム助成事業、若者子育て世帯買い物応援事業、住民運営のサロン事業、打吹公園整備事業、倉吉駅前ファーマーズマーケット整備事業、地域子育て支援拠点事業（利用者支援事業）、サービス付高齢者向け賃貸住宅事業などの推進により、中心市街地において住みやすい環境が整えられつつあったが、平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震で居住環境が損なわれたため、現在復旧を行っているところである。

リノベーション居住推進事業の取組みについては、周知・広報を行い、中心市街地への移住を促すよう積極的に案内をしてきたが、空き家バンクの登録件数の不足を解消するために実施した「空き家活用推進事業」を鳥取県中部地震の影響で一部実施することができなかつたため、中心市街地への移住を促せなかつた。

しかし、地震の影響による社会減の防止と鳥取県中部地震からのいち早い復旧復興に向けて被災住宅の再建の支援や、中心市街地における受入れ環境の整備と移住を促進させる「リノベーション居住推進事業」と「空き家活用推進事業」を実施することで、目標

値±0人の目標達成も可能と見込まれる。

【中心市街地における観光入込客数】

平成28年における中心市街地における観光入込客数は318,977人であった。現在、小川記念館が整備されていない状況の中、基準値からマイナス56,500人程度の観光入込客数の減少であった。倉吉博物館耐震改修工事に伴う平成28年1～2月の休館による減と、平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震により被災し、一定期間使用ができない施設があったことによる影響が大きい。また、開催イベント内容による集客への影響、赤瓦1号館と物産館における入込客数の減少傾向が見られる。

平成28年度は、倉吉淀屋活用事業、県指定文化財維持管理事業、歴史的景観整備事業、インバウンド版名探偵コナンミステリーツアー、ワールド・トレイルズ・カンファレンスなどの観光に資する取組みを実施してきた。小川記念館整備事業については、地震や事業主体の事情により当初計画から遅れているが、平成29年度に整備計画を見直し、事業を推進していく予定である。

地震からのいち早い復興をアピールすることで観光客を呼び込むとともに、円形校舎活用事業や集客力のあるイベント開催と周遊を促す取組みを実施し、あわせて小川記念館整備事業により記念館を整備することで、平成31年における目標値421,400人の目標達成も可能であると見込んでいる。

【中心市街地における創業事業所数】

平成21年度から25年度までの中心市街地における創業事業所数の平均は5件/年であったが、平成27年度における創業事業所数は7件、平成28年度は5件であり、平均6件/年であった。

地域の暮らしを支える商店街づくり事業、地域産業活性化推進事業、倉吉市制度融資事業の推進により、創業への環境が整えられつつある一方、リノベーション居住推進事業の取組みについては、周知・広報を行い、中心市街地への移住を促すよう積極的に案内をしてきたが、空き家バンクの登録件数の不足を解消するために実施した「空き家活用推進事業」を鳥取県中部地震の影響で一部実施することができなかつたため、中心市街地への創業を促せなかつた。

しかし、平成29年度は、平成28年度に実施できなかった中心市街地における受入れ環境の整備と移住に伴う創業を促進させる「空き家活用推進事業」と「リノベーション居住推進事業」の取組みを実施するとともに、新たなタウンマネージャーによる支援により創業数の増が見込まれ、目標値平均8件/年の目標達成も可能と見込まれる。

3. 前回のフォローアップと見通しが変わった場合の理由

平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震の影響により、中心市街地における観光入込客数が激減したが、地震からのいち早い復興をアピールすることで観光客を取り戻すとともに、施設の修繕を行っていることから、進捗状況は予定どおりではないものの、目標達成可能と見込まれる。

4. 目標指標毎のフォローアップ結果

「中心市街地全体の人口の社会増減」※目標設定の考え方基本計画 P46 参照

●調査結果の推移



年	(人)
H21-26	基準値 △121人(累計)
H27	△4人(H27- H28の累計)
H28	△13人(H27- H29の累計)
H29	
H30	
H31	
H27-32	目標値 ±0人(累計)

※調査方法：住民基本台帳を基に中心市街地の転入・転出を集計

※調査月：平成27年2月～平成29年1月

※調査主体：倉吉市

※調査対象：中心市街地内の転入・転出

●目標達成に寄与する主要事業の進捗状況及び事業効果

①リノベーション居住推進事業

事業完了時期	平成26年度～【実施中】ソフト事業
事業概要	古民家や空き家等をリノベーションによって事務所、店舗、住宅等として再生するため、移住相談窓口の設置、移住初期経費等の一部補助、家賃補助等を行う。
事業効果及び進捗状況	相談窓口を設置し、年間292件の移住相談対応を行った。 県外からの移住支援として、4件の補助支援を行った（移住初期経費補助：1件、家賃補助：3件）が、本事業を活用しての中心市街地域内への移住は適わなかった。 平成27年度における中心市街地に移住がなかった1つの要因として、空き家バンクの登録件数の不足が考えられることから、空き家活用推進事業を実施したが、中部地震の影響により、事業の一部しか実施することができず中心市街地における空き家バンク登録件数が伸びなかったため、空き家1物件のみの活用にとどまった。 今後、一部未実施であった空き家活用推進事業を引き続き実施することで、空き家バンクへの登録が増え、移住数も伸びてくると推察される。

②住宅リフォーム助成事業

事業完了時期	平成27年度【済】ソフト事業
事業概要	住宅のリフォームに対する助成を行う。
事業効果及び	中心市街地活性化区域内において、9件の助成を行い、区域外からの

進捗状況	転居もあった。住宅リフォームによる住環境の向上により住人の生活が充実したほか、子・孫世代のＩＪＵターンによる定住につながった。
------	---

③若者子育て世帯買い物応援事業

事業完了時期	平成 19 年度～【実施中】ソフト事業
事業概要	子育て応援カード（商業施設等が協賛店）により、割引・特典サービスを実施する。
事業効果及び進捗状況	平成 28 年度から 5 カ年の事業として、協賛事業者の追加（1 件、累計 86 件）及びカードの新規交付 403 件を行い、発行総数は 2,177 件となった。地域の店舗が子育て世帯の応援に協賛し、生活サービスの充実を図っている。

④住民運営のサロン事業

事業完了時期	平成 19 年度～【実施中】ソフト事業
事業概要	自主交流、介護予防教室、健康教室、認知症検診等を展開する介護予防の拠点として高齢者が集う住民運営のサロンを整備。介護予防ボランティアの養成、立ち上げ支援、運営者育成、運営支援を行う高齢者生活支援コーディネーターの設置を行う。
事業効果及び進捗状況	区域内において、認知症予防教室から住民主体の通いの場である高齢者サロンに 2 教室を移行し、合計で 37 名参加者があった。 平成 28 年度においては平成 29 年度に高齢者生活支援コーディネーターの活動を支えていく「協議体」を設置するための検討を行った。今後、協議体の設置、高齢者生活支援コーディネーターの選定を行う予定。 元気な高齢者の社会活動の場をつくることで、生活サービスが充実した。

⑤打吹公園整備事業

事業完了時期	平成 23～32 年度【実施中】ハード事業
事業概要	体育施設（庭球場、野球場など）の改修、体験学習施設の改修を行う。
事業効果及び進捗状況	平成 28 年度は、老朽化していた市営武道館の照明を LED 化の改修工事を実施し、利用者の利便性を確保したとともに、サイクルコストの縮減化が図られた。 当初予定していた体験学習施設資料館棟の屋根・外壁改修工事については、鳥取中部地震の影響により次年度へ繰り越すこととなった。 なお、打吹公園内の主要な施設（体育施設、体験学習施設等）において既に整備を行った施設が鳥取中部地震により被災しており、公園利用者が安心して安全に利用できるよう、当該事業と並行して災害復旧を早急に進めていく必要がある。

⑥倉吉駅前ファーマーズマーケット整備事業

事業完了時期	平成 27 年度【済】ソフト事業 平成 28 年度～【未】ハード事業
事業概要	老朽化に伴う建替えのため 1 F を農産物直売所として、また 2 F を多目的ホールとして整備する。
事業効果及び進捗状況	平成 27 年度においてはハード事業に向けた整備計画の策定や調査を行った。 調査事業では、ファーマーズマーケット以外の商機も求められる結果や事業箇所に対するマイナス評価があったことから、事業化における検討材料とすることとしている。 ハード整備については、施設整備を行う場所の変更を検討していることより、当初の計画より遅れているが、平成 29 年度以降のハード整備を目指している。

⑦地域子育て支援拠点事業（利用者支援事業）

事業完了時期	平成 27～31 年度【検討実施中、整備未】ハード事業
事業概要	地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、情報収集と提供、必要に応じて相談・助言等を行う施設を設置、また、関係機関との連絡調整を実施し、子育て世帯が集まりやすい拠点整備を検討する。
事業効果及び進捗状況	新たな施設整備の検討に向け、引き続き情報の収集、提供及び相談体制を整えている。 子育て世帯が住みたくなる環境を整えることで、居住人口の増加、定住化を図っていく必要がある。

⑧サービス付高齢者向け賃貸住宅事業

事業完了時期	平成 27 年度【済】ハード事業
事業概要	サービス付高齢者向け賃貸住宅の整備を行う。
事業効果及び進捗状況	平成 27 年 11 月に供用開始し、平成 28 年 3 月末時点で 22 名の入居があった。設備の整った利便性の高い高齢者向けの住宅を提供することにより、居住の増加し、定住化が図られた。 なお、平成 29 年 3 月末時点では、31 名の入居となっている。

●目標達成の見通し及び今後の対策

平成 21 年から 26 年までの 5 年間に於いて中心市街地全体の人口の社会増減の累計は△121 人であったが、平成 27 年 2 月から平成 29 年 1 月までの 2 年間に於いては△13 人となった。

住宅リフォーム助成事業、若者子育て世帯買い物応援事業、住民運営のサロン事業、打吹公園整備事業、倉吉駅前ファーマーズマーケット整備事業、地域子育て支援拠点事業（利用者支援事業）、サービス付高齢者向け賃貸住宅事業などの推進により、中心市街地にお

いて住みやすい環境が整えられつつあったが、平成 28 年 10 月 21 日に発生した鳥取県中部地震で居住環境が損なわれたため、現在復旧を行っているところである。


リノベーション居住推進事業の取組みについては、周知・広報を行い、中心市街地への移住を促すよう積極的に案内をしてきたが、空き家バンクの登録件数の不足を解消するために実施した「空き家活用推進事業」を鳥取県中部地震の影響で一部実施することができなかつたことため、中心市街地への移住を促せなかつた。

しかし、地震の影響による社会減の防止と鳥取県中部地震からのいち早い復旧復興に向けて被災住宅の再建の支援や、中心市街地における受入れ環境の整備と移住を促進させる「リノベーション居住推進事業」と「空き家活用推進事業」を実施することで、目標値±0人の目標達成も可能と見込まれる。

4. 目標指標毎のフォローアップ結果

「中心市街地における観光入込客数」※目標設定の考え方基本計画 P50 参照

●調査結果の推移

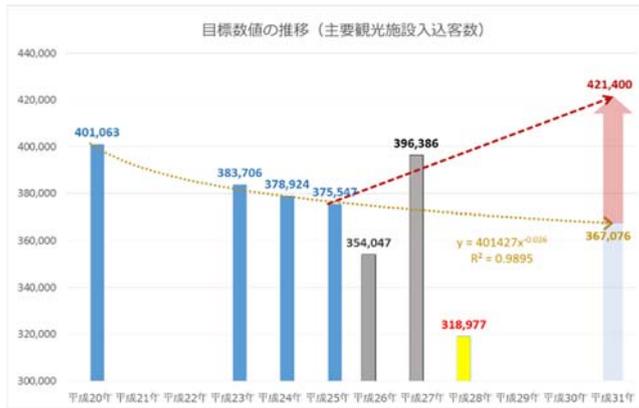

年	(人)
H25	基準値 375,500 人
H26	—
H27	396,386 人
H28	318,977 人
H29	
H30	
H31	目標値 421,400 人

※調査方法：中心市街地内の6施設の観光入込客を集計

※調査月：平成28年1月～平成28年12月

※調査主体：倉吉市

※調査対象：中心市街地内の6施設の観光入込客数

●目標達成に寄与する主要事業の進捗状況及び事業効果

①小川記念館整備事業

事業完了時期	平成27年度【済】ソフト事業 平成28年度～【未】ハード事業
事業概要	小川家の主屋、酒蔵、庭園が県文化財指定を受けることを契機に、展示機能を有した改修、庭園の復原整備を行い、新たな集客施設として整備する。主屋の県の文化財指定を機に、蔵の一部を改修し、土産物販売、喫茶・軽食販売が行える店舗として整備する。
事業効果及び進捗状況	平成27年度においてはハード事業に向けた整備計画の策定や調査を行った。 調査事業では、飲食機能がメインで求められる結果があったことから、事業化における検討材料とすることとしている。 ハード整備に関しては、平成28年度において設計業務のみを行った。平成29年度に、地震による被災部分の修理を行った後、整備計画を見直しし、事業を実施する予定である。

②倉吉淀屋活用事業

事業完了時期	平成27年度【済】ソフト事業 平成28年度～平成30年度【実施中】ハード事業
事業概要	倉吉淀屋付属屋の修理・復原、修繕、トイレなどの施設整備を行う。
事業効果及び進捗状況	平成27年度においてはハード事業に向けた整備計画の策定を行った。

	平成 28 年度は付属屋の屋根や西側外壁の修理などを行ったところであり、平成 29 年度には付属屋全体の修理を終える予定である。 (平成 30 年度に庭の整備を行い完成する予定である。)
--	--

③県指定文化財維持管理事業

事業完了時期	平成 23 年度～【実施中】
事業概要	県指定保護文化財建造物及び県指定名勝（庭）をもつ桑田家及び高田家の維持保全、メンテナンスを行う。
事業効果及び進捗状況	桑田家、高田家とも建造物、庭園に地震による被害が生じたことから、復旧工事を一部行うとともに、平成 29 年度以降の修理計画を策定した。 魅力ある観光拠点、面的な波及効果に繋がる事業であることから、引き続き事業を行う。

④歴史的景観整備事業

事業完了時期	平成 23 年～平成 32 年度【実施中】
事業概要	既存の伝統的建造物群保存地区の修理・修景事業の維持・更新を図るとともに、新たな伝建地区の指定やそれに伴う修理・修景事業の実施、街なみ環境整備を実施する。
事業効果及び進捗状況	街並み環境整備として、街並み環境整備として、当初 7 件程度の家屋の外観整備を予定していたが、震災の影響により 13 件の修理を兼ねた外観整備を実施しているところ。 また文化財として、6 件の修理・修景事業を行った。鳥取県中部地震影響もあり 30 件の建造物と工作物の修理の準備を行った 歴史的街並みの魅力が維持・向上され、交流人口の増加へ寄与が期待される。

⑤観光駐車場整備事業

事業完了時期	平成 27 年度【済】ハード事業
事業概要	シビックセンターたからや跡地を観光駐車場として整備を行う。
事業効果及び進捗状況	観光駐車場としてバス 7 台、一般車両 63 台を整備。 観光環境の向上により、交流人口の増が今後期待される。

⑥名探偵コナンミステリーツアー

事業完了時期	平成 27 年度【済】ソフト事業
事業概要	倉吉駅ー赤瓦・白壁土蔵群とその他周辺町の観光スポットを結び、各地でミステリーを解く名探偵コナンのツアーを開催する。
事業効果及び進捗状況	平成 27 年度の名探偵コナンミステリーツアーでは参加総数 1,641 名があった。 平成 28 年度には、インバウンド版の名探偵コナンミステリーツアー

	を実施し、5912名の参加があり、周遊観光が活性化され、地域のPR促進や交流人口の増加に寄与した。
--	---

⑦アジア・トレイルズ・カンファレンス

事業完了時期	平成27年度【済】ソフト事業
事業概要	ウォーキングやトレイル関係者が集まる世界大会「ワールド・トレイルズ・カンファレンス（WTC）」のアジア大会を開催する。
事業効果及び進捗状況	参加総数396名があり、地域のPR促進や交流人口の増加に寄与した。

⑧ワールド・トレイルズ・カンファレンス

事業完了時期	平成28年度【済】ソフト事業
事業概要	ウォーキングやトレイル関係者が集まる世界大会「ワールド・トレイルズ・カンファレンス（WTC）」を開催する。
事業効果及び進捗状況	参加総数2,282名があり、アジア・トレイルズ・カンファレンスと同様に地域のPR促進や交流人口の増加に寄与した。

●目標達成の見通し及び今後の対策

平成28年における中心市街地における観光入込客数は318,977人であった。現在、小川記念館が整備されていない状況の中、基準値からマイナス56,500人程度の観光入込客数の減少であった。倉吉博物館耐震改修工事に伴う平成28年1～2月の休館による減と、平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震により被災し、一定期間使用ができない施設があったことによる影響が大きい。また、開催イベント内容による集客への影響、赤瓦1号館と物産館における入込客数の減少傾向が見られる。


平成28年度は、倉吉淀屋活用事業、県指定文化財維持管理事業、歴史的景観整備事業、インバウンド版名探偵コナンミステリーツアー、ワールド・トレイルズ・カンファレンスなどの観光に資する取組みを実施してきた。小川記念館整備事業については、地震や事業主体の事情により当初計画から遅れているが、平成29年度に整備計画を見直しし、事業を推進していく予定である。

地震からのいち早い復興をアピールすることで観光客を呼び込むとともに、円形校舎活用事業や集客力のあるイベント開催と周遊を促す取組みを実施し、あわせて小川記念館整備事業により記念館を整備することで、平成31年における目標値421,400人の目標達成も可能であると見込んでいる。

4. 目標指標毎のフォローアップ結果

「中心市街地における創業事業所数」※目標設定の考え方基本計画 P54 参照

●調査結果の推移

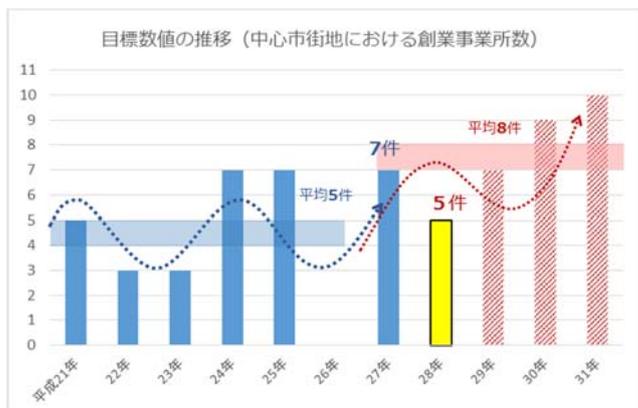

※調査方法：倉吉商工会議所が把握している中心市街地内の創業事業所を集計

※調査月：平成27年4月～平成29年3月

※調査主体：倉吉商工会議所

※調査対象：中心市街地内の創業事業所

年	件
H21-25年度	基準値 平均5件/年
H26年度	—
H27年度	7件
H28年度	5件 平均6件/年
H29年度	
H30年度	
H31年度	
H27-31年度	目標値 平均8件/年

●目標達成に寄与する主要事業の進捗状況及び事業効果

①リノベーション居住推進事業

事業完了時期	平成26年度～【実施中】ソフト事業
事業概要	古民家や空き家等をリノベーションによって事務所、店舗、住宅等として再生するため、移住相談窓口の設置、移住初期経費等の一部補助、家賃補助等を行う。
事業効果及び進捗状況	<p>相談窓口を設置し、年間292件の移住相談対応を行った。</p> <p>県外からの移住支援として、4件の補助支援を行った（移住初期経費補助：1件、家賃補助：3件）が、本事業を活用しての中心市街地域内への移住は適わなかった。</p> <p>平成27年度における中心市街地に移住がなかった1つの要因として、空き家バンクの登録件数の不足が考えられることから、空き家活用推進事業を実施したが、中部地震の影響により、事業の一部しか実施することができず中心市街地における空き家バンク登録件数が伸びなかったため、空き家1物件のみの活用にとまった。</p> <p>今後、一部未実施であった空き家活用推進事業を引き続き実施することで、空き家バンクへの登録が増え、移住数も伸びてくると推察される。</p>

②地域の暮らしを支える商店街づくり事業

事業完了時期	平成 15 年度～【実施中】ソフト事業
事業概要	空き店舗等を活用した日常生活を支える店舗（食品や日用品等の店舗、食堂等）の設置や、地域コミュニティスペースの設置・運営を行う不動産所有者や民間事業者、地域団体等の取り組みを支援する。 （既存事業の「にぎわいのある商店街づくり事業費補助金」「チャレンジショップ運営事業」）
事業効果及び進捗状況	にぎわいのある商店街づくりにおいて家賃補助として 8 件、店舗改装として 2 件の支援を行い、チャレンジショップ運営事業では 3 件の利用があった。 商店街の空き店舗等を活用し、新規の出店を図ることができた。

③地域産業活性化推進事業

事業完了時期	平成 27 年度～【実施中】ソフト事業
事業概要	地域産業活性化推進員の配置による就業情報提供、空き店舗のマッチング支援、市内事業者の販路開拓を支援する。
事業効果及び進捗状況	H28 年度空き店舗マッチング相談受付件数（貸借希望）22 件。H28 年度中市内新規開業数 17 件。販路開拓補助 6 件。 支援を行うことにより、事業者の創業、商店街の活性化に繋がった。

④倉吉市制度融資事業

事業完了時期	昭和 38 年度～【実施中】ソフト事業
事業概要	中小企業者に貸付を行う金融機関に対し、その資金の一部を預託することで、長期低利の制度融資を実施する。
事業効果及び進捗状況	H28 年度の制度融資として、実行件数 99 件、融資実行額 1,183,085 千円、また災害等緊急対策資金融資は実行件数 88 件、融資実行額 614,844 千円を融資することにより、地域の商工業の振興・災害復旧による経営の継続に寄与した。

⑤倉吉市中心市街地活性化協議会タウンマネージャー設置事業

事業完了時期	平成 26 年度～平成 31 年度【実施中】ソフト事業
事業概要	倉吉市中心市街地活性化協議会にタウンマネージャーを設置する。
事業効果及び進捗状況	タウンマネージャーの募集を継続していたが、応募がなかったため、平成 28 年度当初は事業を推進する専門人材として、事業推進コーディネーターを設置し、事業を推進した。また、継続募集の結果、タウンマネージャーの応募があり、平成 28 年度 10 月より新たなタウンマネージャーを設置した。経験が豊富な事業推進コーディネーターと新しい視点を持つタウンマネージャーの協働により、事業のブラッシュアップ等を行い、事業の推進を行った。

●目標達成の見通し及び今後の対策

平成 21 年度から 25 年度までの中心市街地における創業事業所数の平均は 5 件/年であったが、平成 27 年度における創業事業所数は 7 件、平成 28 年度は 5 件であり、平均 6 件/年であった。

地域の暮らしを支える商店街づくり事業、地域産業活性化推進事業、倉吉市制度融資事業の推進により、創業への環境が整えられつつある一方、リノベーション居住推進事業の取組みについては、周知・広報を行い、中心市街地への移住を促すよう積極的に案内をしてきたが、空き家バンクの登録件数の不足を解消するために実施した「空き家活用推進事業」を鳥取県中部地震の影響で一部実施することができなかつたため、中心市街地への創業を促せなかつた。

しかし、平成 29 年度は、平成 28 年度に実施できなかつた中心市街地における受入れ環境の整備と移住に伴う創業を促進させる「空き家活用推進事業」と「リノベーション居住推進事業」の取組みを実施するとともに、新たなタウンマネージャーによる支援により創業数の増が見込まれ、目標値平均 8 件/年の目標達成も可能と見込まれる。
